



STESV

202433601075491

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 20 de 2024

Señor
DIEGO ARMANDO RINCÓN
Twitter: @darincon123
Bogotá, D.C.

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA IDU-1397-2017 - ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.

REF: DERECHO DE PETICIÓN - RADICADO IDU No. 202418501408412 DEL 12-08-2024 - REQUERIMIENTO IDU No. 270799 - RADICADO BTE No. 3746032024 ¿ PROYECTO AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS - CONTRATO IDU-1397-2017

Respetado Señor Rincón,

En atención a la solicitud contenida en la comunicación de la referencia en la cual se indica que,

“... Y la extensión de la avenida Mutis? Esa obra está detenida y le falta muy poco ...”

Cordialmente le informamos que, el Instituto de Desarrollo Urbano ejecuta actualmente el Contrato de Obra IDU-1397-2017 suscrito con la firma CONSORCIO AVENIDA MUTIS y tiene por objeto la ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A (CARRERA 114) HASTA LA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.


El control y seguimiento al Contrato de Obra se realiza por CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL SAS, bajo el Contrato de Interventoría IDU-1470-2017 que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.




STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número


LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA LA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.

El alcance del objeto del Contrato de Obra contempla la construcción de 9,38 km / carril de vía mixta compuesta de dos (2) calzadas de tres (3) carriles cada una; 18.466,08 metros cuadrados de espacio público y 2,03 kilómetros de ciclorruta sobre la calzada sur del proyecto.

La sección típica del tramo de la Avenida José Celestino Mutis (AC 63) corresponde a la aproximación de una Vía tipo V-3, que cuenta con tres carriles en cada sentido de 9,25 m de ancho (1 carril de 3.25 m y dos de 3.0 m), con un separador central de ancho 1.0 m, que se complementa con franjas para peatones de 3,4 m costado norte y 7,1 m costado sur incluyendo una ciclorruta de 3.0 m de este costado.

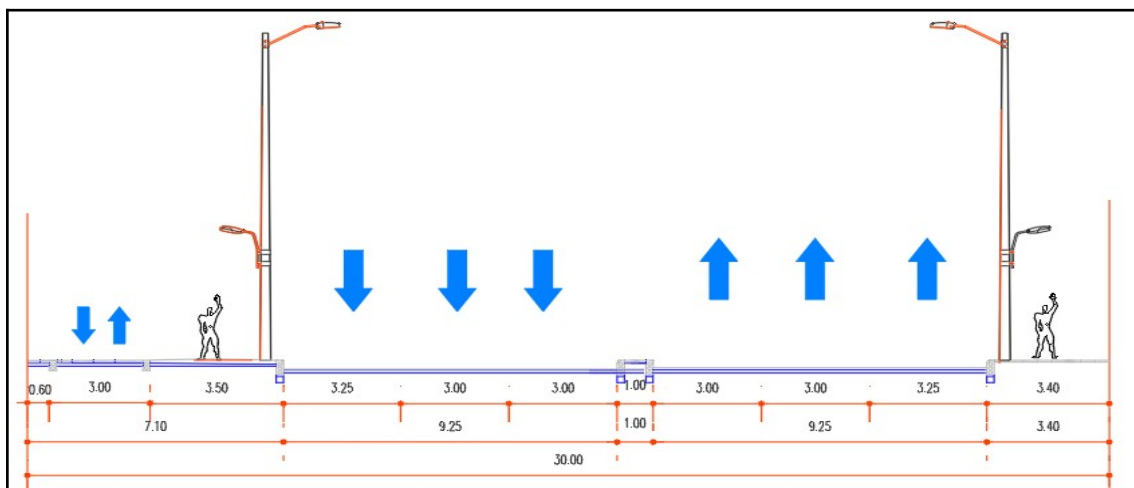


En el tramo final se propone un retorno oriente – oriente y para dar continuidad a los flujos y la operación vehicular el cual se modelo para vehículo de servicio público, la cual se ajustó, teniendo en cuenta la Acción Popular asociada a la conexión de la cicloruta y las observaciones de la Secretaria Distrital de



STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número

Movilidad, dejando en el espacio público el área para la conexión de la cicloruta.

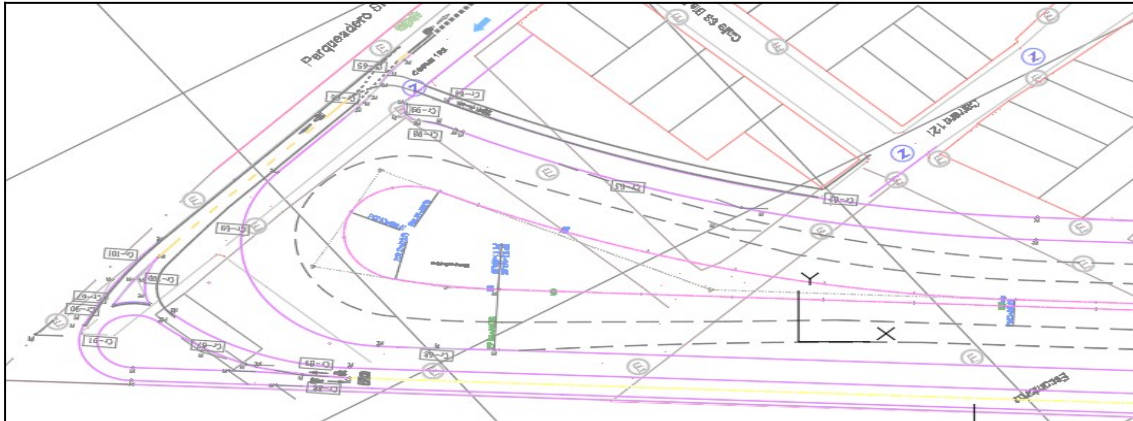

A corte del 12-08-2024 se tiene el siguiente avance en sus metas físicas y en cada uno de los frentes de obra del proyecto, así:


DESCRIPCIÓN META FÍSICA	UNIDAD	META FÍSICA TOTAL	AVANCE (*)
Vía mixta	km / carril	9,38	5,81
Vía mixta	km / lineal	3,13	1,92
Espacio Público	m ²	18.466,08	9.056
Ciclorruta	km	2,03	0,94

(*) avance con corte al 12-08-2024

LOC.	TRAMO	INICIO-FIN	LONGITUD APROXIMADA (METROS)	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	% AVANCE EJECUTADO (*)
ENGATIVA	TRAMO 1	Carrera 122 desde la CL 63 Bis A hasta CL 63B	225	K1+530	K1+775	100,00%
	TRAMO 2	Av. José Celestino Mutis desde la Carrera 118A hasta la Carrera 122	390	K1+140	K1+530	96,44%
	TRAMO 3	Av. José Celestino Mutis desde la Carrera 113Bis hasta la Carrera 118A	582	K0+558	K1+140	63,60%
	TRAMO 4	Av. José Celestino Mutis desde la TV 112B Bis A hasta la Carrera 113 Bis	345	K0+213	K0+558	61,36%

(*) avance con corte al 12-08-2024.

A continuación se relacionan algunas de las actividades de obra que se ejecutan actualmente:




STESV

202433601075491

Información Pública

Al responder cite este número

- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de adoquín de arcilla en zona de espacio público en el costado norte k1+140.
- ✓ Se adelanta la actividad de excavación manual para instalación de sardinel prefabricado A-10 para construcción de gradas en zona de espacio público costado norte en el k1+490 al k1+510.
- ✓ Se adelanta la actividad de excavación manual para la instalación de bordillo prefabricado A-80 para confinamiento de paño de zona de espacio público en el k1+150 costado norte.
- ✓ Se adelanta la actividad Instalación de sardinel prefabricado A-10 en el costado norte para gradería en la zona de espacio público en el k1+530 A k1+520.
- ✓ Se adelanta la actividad de emboquillado de sardinel prefabricado A-10 en el costado norte para gradería en la zona de espacio público en el k1+530 A k1+520.
- ✓ Se adelanta la actividad de Instalación de riego asfáltica en la calzada sur en el k0+760 al k0+680 para la instalación de la mezcla MD12.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de mezcla asfáltica (MD12) en la calzada sur calzada completa en el k0+760 a k0+680.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de losetas prefabricadas A-50 -A-55- A-56 Y adoquín A-26 en zona de espacio público costado norte en el k0+695 a k0+700.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de emulsión asfáltica en la calzada sur en el k0+680 al k0+570 calzada completa.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de mezcla asfáltica (MD12) en la calzada sur en el k0+680 al k0+570 calzada completa.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de acero de refuerzo para la construcción de cárcamo para la red de semaforización en la calzada norte en el k0+863.



STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número

- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de mezcla asfáltica (MD12) en la calzada sur del k0+637 al k0+578 en la calzada completa.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de tubería de TDP de 6" en el costado norte para red Enel en el k0+820.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de arena de soporte para paño de zona de espacio público costado sur del k0+471 al k0+463.
- ✓ Se adelanta la actividad de instalación de concreto realizado en obra para viga de cabezal de contenedor de raíz en el costado sur zona de espacio público en el k0+423 y k0+308.
- ✓ Se adelanta la actividad de Instalación de parte inferior de sumidero prefabricado en la calzada sur en el k0+460.


A continuación se presenta un registro fotográfico de algunas de las actividades de obra que se adelantan en el proyecto:





STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número






STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número





STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número





STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número




Como se puede evidenciar la construcción de la Avenida José Celestino Mutis
no se encuentra detenida y se vienen adelantando las actividades de obra

9

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV

202433601075491

Información Pública

Al responder cite este número


contenidas en el alcance del contrato. Desde este Instituto y con el seguimiento por parte de la Interventoría del proyecto, continuaremos con la supervisión a las actividades de obra por ejecutar garantizando así que, para finales del mes de diciembre de 2024 se podrá entregar esta obra a la ciudad, obra que beneficiará más de 150.000 personas localizadas en el área de influencia de las obras, particularmente la población de los barrios Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys de la localidad de Engativá.

Esta conexión permitiría una mejora significativa a la accesibilidad al Distrito desde el occidente mejorando los tiempos de viaje y las condiciones de movilidad de corredores como la Avenida Calle 80 y la Avenida Calle 13. Adicionalmente, brinda un beneficio único al conectar de manera directa al aeropuerto internacional El Dorado con la región. Esto implicaría una reducción importante de vehículos de todo tipo circulando por las vías del Distrito y mejorando la competitividad de la distribución de Carga y Mercancías que circula desde y hacia el exterior por modo aéreo.

Por otro lado, lo invitamos cordialmente a participar en el Comité IDU, espacio en donde informamos a la ciudadanía de manera periódica sobre el avance de la obra y las acciones asociadas al mismo. Si desea inscribirse, puede realizarlo a través de nuestros siguientes canales de atención: Presencial - Calle 63 L # 121 - 18, virtual - participacionciudadana1397@gmail.com, líneas telefónicas: Línea móvil 3502743476 o Línea fija (601) 7560439.

En este sentido, se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

10

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV
202433601075491
Información Pública
Al responder cite este número

Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 20-08-2024 08:38:04 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL S.A.S. - Bogotá DC - Bogotá - AC 26 69 D 91 Centro Empresarial Arrecife Torre 2 Oficina 202 - laura.mesa@cemosa.es
Con Copia a: BOGOTÁ TE ESCUCHA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - Bogotá DC - Bogotá - KR 8 10 65 - sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co
Con Copia a: CONSORCIO AVENIDA MUTIS - Bogotá DC - Bogotá - CL 63 L 121 18 - consorcioavmutis@congrescol.com

Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZÓN URREGO - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: CARLOS ALBERTO LEURO BERNAL-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
