

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CHP164319	Kr 3 # 30C - 12.50'	101-5358	101-5359	101-5360	101-5361	
2	CHP127984	Kr 3 # 30C - 04.50'	101-5362	101-5363	101-5364	101-5365	
3	CSL 61620	Kr 3. # 30C - 16.50'	101-5366	101-5367	101-5368	101-5369	
4	PHP118575	calle 30B sur con Kr 3A	101-5376	101-5371	101-5372	101-5373	
5	CHP 134191	Kr 3A # 30A - 36.50'	101-5374	101-5375	101-5376	101-5377	
6	CHP 134148	calle 30B sur con Kr 3B	101-5378	101-5379	101-5380	101-5387	
7	CSL 61603	calle 30B sur con Kr 3B	101-5382	101-5383	101-5384	101-5385	
8	CHP 134073	calle 30B sur con Kr 3B	101-5386	101-5387	101-5388	101-5389	
9	CHP 134050	Kr 3B con calle 30B sur	101-5390	101-5391	101-5392	101-5393	
10	CSL 61603A	Kr 3B con calle 30B sur	101-5394	101-5395	101-5396	101-5397	
11	CSL 61603B	Kr 3B con calle 30B sur	101-5398	101-5399	101-5400	101-5401	
12	CHP 80366	calle 30A sur # 3A - 34	101-5402	101-5403	101-5404	101-5405	
13	CHP 164451	calle 30A sur # 3A - 26	101-5406	101-5407	101-5408	101-5409	
14	CHP 164451A	calle 30A sur # 3-18	101-5410	101-5411	101-5412	101-5413	
15	CSL 61603C	calle 30A sur # 3A - 26	101-5414	101-5415	101-5416	101-5417	
16	CHP 134012	calle 30A sur con Kr 4	101-5418	101-5419	101-5420	101-5421	
17	CSL 61608	calle 30A sur con Kr 4	101-5422	101-5423	101-5424	101-5425	
18	CSK 44457	calle 30A sur # 4-10	101-5426	101-5427	101-5428	101-5429	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

20-08-2021

4/1



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 1
Direccion: KV 3 # 30C-12
Levanto: Wendy Alvarez Payares
Pozo Numero: CMP 164319
Cota Rasante: 2621.92
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corroidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

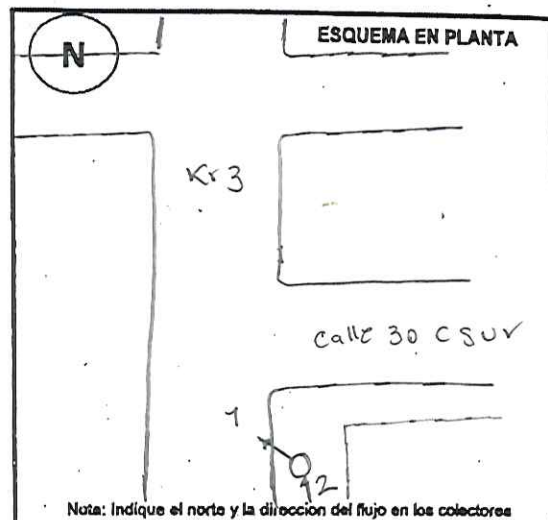

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.50	PVC
2	34"	1.84	gicess
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5358 A 101-5361

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 2
 Direccion: Kr 3 # 30c-04 sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 127984
 Cota Rasante: 2621.67

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Conditos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Ralces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

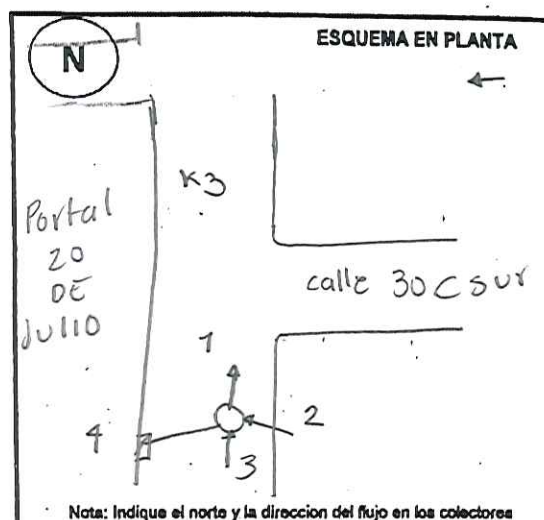

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.50	PVC
2	12"	2.41	PVC
3	12"	7.73	PVC
4	12"	7.75	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5362 A 101-5365



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva KI 3 # 300-16 SUR

id_sig: VCSL 61620

Costado OCCIDENTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio BELLO Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input type="checkbox"/>
	Lateral <input checked="" type="checkbox"/>		Hierro <input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	150 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input checked="" type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción:	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

TUBERIA Ø 12" - PVC - CLAVE 1.04 m

Wendy Alvarez P.

Firma inspector

101-5366 A 101-5364



Estado Pozo			
Estado?	<input type="checkbox"/> Infiltracion	<input type="checkbox"/> Represado	<input type="checkbox"/> Con basura
	<input type="checkbox"/> Raices	<input type="checkbox"/> Fuera de Servicio	<input type="checkbox"/> Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5376 a 101-5373

ESQUEMA EN PLANTA

N

Colegio


Kr 3 A

Calle 3035

1 2 3

Portal del 20 de Julio

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.40	3.09	concreto
2	19"	2.51	güic
3	1.40	3.00	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: Laja

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 5
 Dirección: KV. 3A # 30A-36 SUR
 Levanto: Wendy Álvarez Payares
 Pozo Número: CMP 134171
 Cota Rasante: _____
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? _____
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

ESQUEMA EN PLANTA

N

KV 3A

colegio

1

2


3

4

Calle 30B Sur

Portal 20 de Julio

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.54	PVC
2	12"	7.27	PVC
3	10"	2.44	g्रेस
4	12"	1.08	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5374 A 101-5377



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 6
 Dirección: calle 308 SUR con Kr 3B
 Levanto: Wendy RIVAREZ PAYARES
 Pozo Numero: CMP 134148
 Cota Rasante: 2616.59

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5378 A 101-5381

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

ESQUEMA EN PLANTA


N

Kr3B

1 2


Portal 20 DE JULIO

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Materia
1	1.40	3.87	concreto
2	1.40	1.92	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id_sig:

20-08-2021

calle 30B Sur con Kr 3B

CSL 61603

Costado occidente

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	150	<input checked="" type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 12" - PVC - clave 1.07m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5382 A 101-5385



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ARBO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 8
 Direccion: calle 30B sur con KR3B
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 134073
 Cota Rasante: 2616.46

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☐ Pozo ☒ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

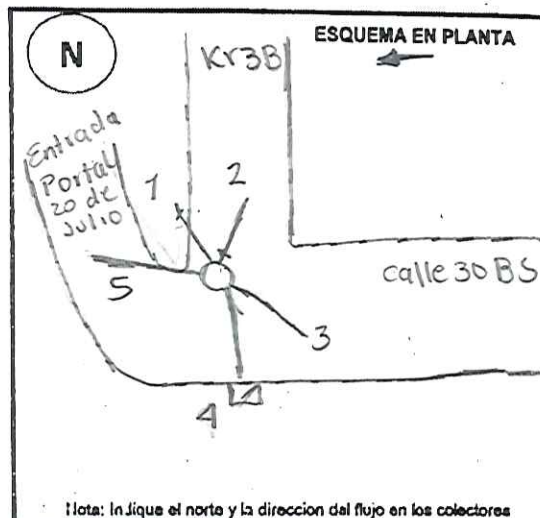

Nº	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.40	3.93	concreto
2	12"	0.93	PVC
3	1.40	3.93	concreto
4	12"	1.07	PVC
5	14"	2.16	concreto
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5386 A 101-5389

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 9
 Dirección: KV 3B con calle 30B sur
 Levanto: wendy alvarez payares
 Pozo Numero: CMP 134050
 Cota Rasante: 2617.35

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Paquete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la folio: 101-5390 A 101-5393

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

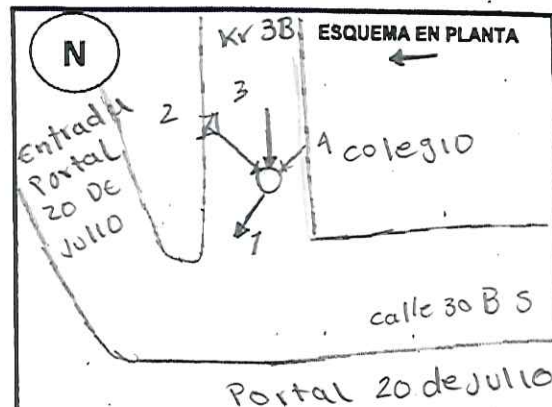

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.46	PVC
2	10"	1.07	PVC
3	12"	1.09	PVC
4	6"	0.85	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



acueducto

INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id_sig:

C5L61603A

Costado NORTE

Inspector

Barrio

Calzada

Wendy Alvarez

Bello Horizonte

mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:

Transversal

Lateral

Convencional

☐☒☒

Material de la
rejilla:

Concreto

Hierro

Otro

☒☒☐

Tamaño Rejilla(cm):

45x85

70x35

90x35

150x50

☐☐☐☒

Condición
estructural de la
Rejilla:

Buena

Fracturada

Desportillada

Rota

Ausente

☒☐☐☐☐

Longitud Abertura
Lateral(cm):

100

150

200

250

☐☐☒☐

Condición Tapa de
Acceso:

Buena

Fracturada

Desportillada

Rota

Ausente

☒☐☐☐☐

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:

Ninguna

Muro

Marco

Otra:

☒☐☐☐

Estado de la vía:

Pavimentada

Sin Pavim.

☒☐

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.
Nivel de sedimentación
dentro del sumidero

1/4

1/2

3/4

Total

☐☐☐☐

Rejilla colmatada

1/4

1/2

3/4

Total

☐☐☐☐

Presencia de Olores:

Si

☐

No

☒

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 12" - PVC - clave 072

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5394 A 101-5397

10



acueducto

INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id_sig: COL 61603B

Costado 501

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input checked="" type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
	550x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
			Ausente	<input type="checkbox"/>	

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

tubería 6" - PVC - clave 0.74

Wendy Alvarez P

Firma Inspector

IDENTIFICACION FOTOS: 101-5398 A 101-5401

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 12
 Direccion: CALLE 30 A SUR # 3A - 34
 Levanto: Wendy Angret Pasares
 Pozo Numero: CMT 80766 80766
 Cota Rasante: 2620.21
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Conoidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

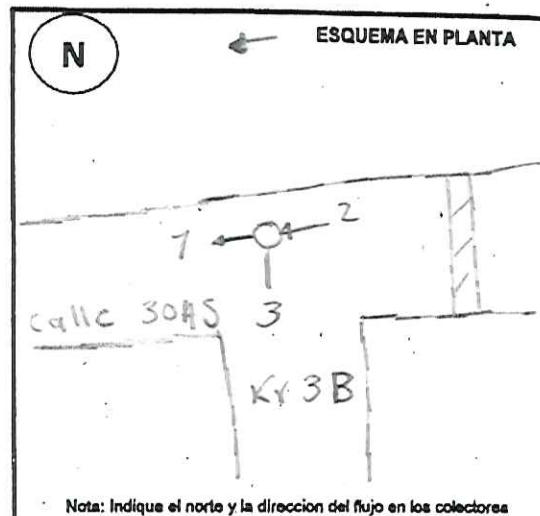

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.30	Concreto
2	12"	2.07	Concreto
3	12"	1.89	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5402 A 101-5405



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 13
Direccion: Calle 30A SUR # 3A-26
Levanto: Wendy Alvaizet Payaies
Pozo Numero: CMP 169451
Cota Rasante: 2620.79
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cancheta
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS



No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.24	concreto
2	12"	0.82	PVC
3	6"	0.93	PVC
4	12"	1.74	grietas
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5406 a 101-5409

13

Fecha: 20-03-2021 Consecutivo: 14
 Dirección: CALLE 30A SUR # 3-18
 Levanto: Wendy Alvariz Payares
 Pozo Numero: CHP164451A
 Cota Rasante: 2622.39

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camera ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Tipo Escalones: ☐ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladors ☐ Fallan ☐ Conoidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5410 A 101-5413

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

ESQUEMA EN PLANTA


N

7 ← 2

Calle 30A SUR


Kr 3A

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores



No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.46	griess
2	8"	1.45	griess
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 30A Sur # 3A-26

id_sig: CSI 61603 C

Costado ORIENTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input checked="" type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Ausente	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Buena	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
				Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	


Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 12" - PVC - clave 0.88m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5419 A 101-5417



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 20-08-2021 Consecutivo: 16
Direccion: Calle 30A Sur con K14
Levanto: Wendy Alvarez Paduares
Pozo Numero: CMP 139012
Cota Rasante: 2617.64
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Conoidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra




No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.46	concreto
2	12"	1.29	concreto
3	12"	0.77	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5418 A 101-5421

16



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 30a sur con kr 4

id_sig: CSL 61608

Costado occidente

Inspector wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input type="checkbox"/>
	Lateral <input checked="" type="checkbox"/>		Hierro <input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input checked="" type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	150 <input checked="" type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4 <input type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input checked="" type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	


Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido


tubería de 12" - concreto - clave 1.00m

wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5422 A 101-5425





INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 20-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id_sig: CSR 44457

Costado occidente

Inspector Wendy Alvaréz

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	150	<input checked="" type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 10" - concreto - clave 1.10m

Wendy Alvaréz P.

Firma Inspector

101-5426 A 101-5429
